

新庁舎建設工事【進捗状況】

令和6年12月

ドローン空撮 (全景写真)

※プライバシー配慮のため画像を一部加工しています

周辺の皆様にはご迷惑をおかけしますが、引き続き
工事へのご理解とご協力をお願いいたします。

西側から



南側から



東側から




スラブ型枠状況（2階上部（3階床））



コンクリート打設状況（2階上部（3階床））



外部足場状況

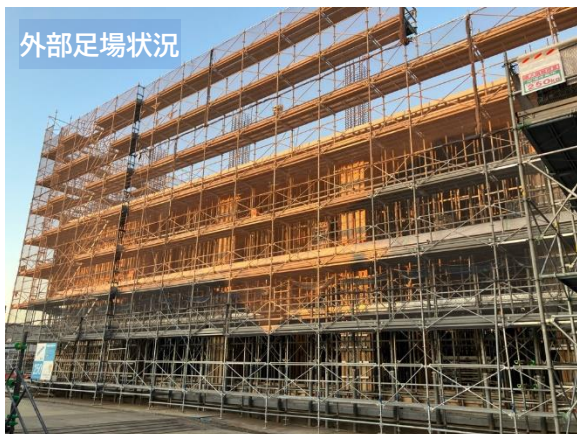

階層が上がると共に外部足場も高く組み立てられてきました。

2階の立ち上げ工事が完了した工区から3階床部分の工事が進んでいます。3階の床部分（スラブ）へのコンクリート打設後は4階の柱、壁の立ち上げ工事が進められます。

また、新庁舎西側にある附属棟は1月から鉄骨が組み立てられる予定です。

朝倉市 都市建設部 庁舎整備室
