

朝倉市復興計画(H30.3)における主な事業予定箇所

平成29年7月九州北部豪雨における復旧事業の進捗状況について

※改良復旧事業の採択状況については、参考資料1を参照。

※各地区及び個別事業の進捗状況については、参考資料2・3を参照。

河川

○国土交通省九州北部豪雨復興出張所

- ・権限代行(全国初)により赤谷川、乙石川、大山川の改良復旧を実施。
- ・原形復旧区間は工事着手、改良復旧区間は調査・測量・設計中。

○朝倉県土整備事務所

- ・9河川(白木谷川、北川、桂川、新立川、荷原川、妙見川、佐田川、黒川、疣目川)で改良復旧を実施。
- ・桂川ほか一部区間で工事着手、その他は調査・測量・設計中。
- ・原形復旧となる野鳥川ほか3河川は工事完了。

○朝倉市公共土木施設災害対策室

- ・小河内川、平川、奈良ヶ谷川(通堂川)は一定災により改良復旧を実施(普通河川としては全国初)。
- ・61河川のうち、18河川は工事完了、36河川は工事中。

道路

○朝倉県土整備事務所

- ・県道甘木吉井線及び安谷赤谷線の一部区間で改良復旧を実施。
- ・11路線のうち4路線は工事完了、7路線は工事中。

○朝倉市公共土木施設災害対策室

- ・116路線のうち、38路線は工事完了、31路線は工事中。


砂防

○国土交通省九州北部豪雨出張所

- ・赤谷川流域30溪流で直轄砂防事業(砂防堰堤)を計画。
- 1溪流で砂防堰堤本体工事に着手、15溪流は準備工事中または契約済み、その他は設計中。

○朝倉県土整備事務所

- ・33溪流で砂防事業(砂防堰堤等)を計画。9溪流は工事中または契約済み、8溪流は年度内に発注予定、その他は国との協議や設計中等。
- ・9地区で急傾斜地崩壊対策事業(法面工)を実施。8地区は工事中または契約済み、1地区は年度内に発注予定。
- ・3地区で地すべり対策事業を実施。2地区は工事中または契約済み、1地区は工事発注済。
- ・原形復旧11箇所のうち、6箇所は工事完了、その他は国と協議中等。
- ・寒水川で砂防流路の改良を計画。調査・測量・設計中。

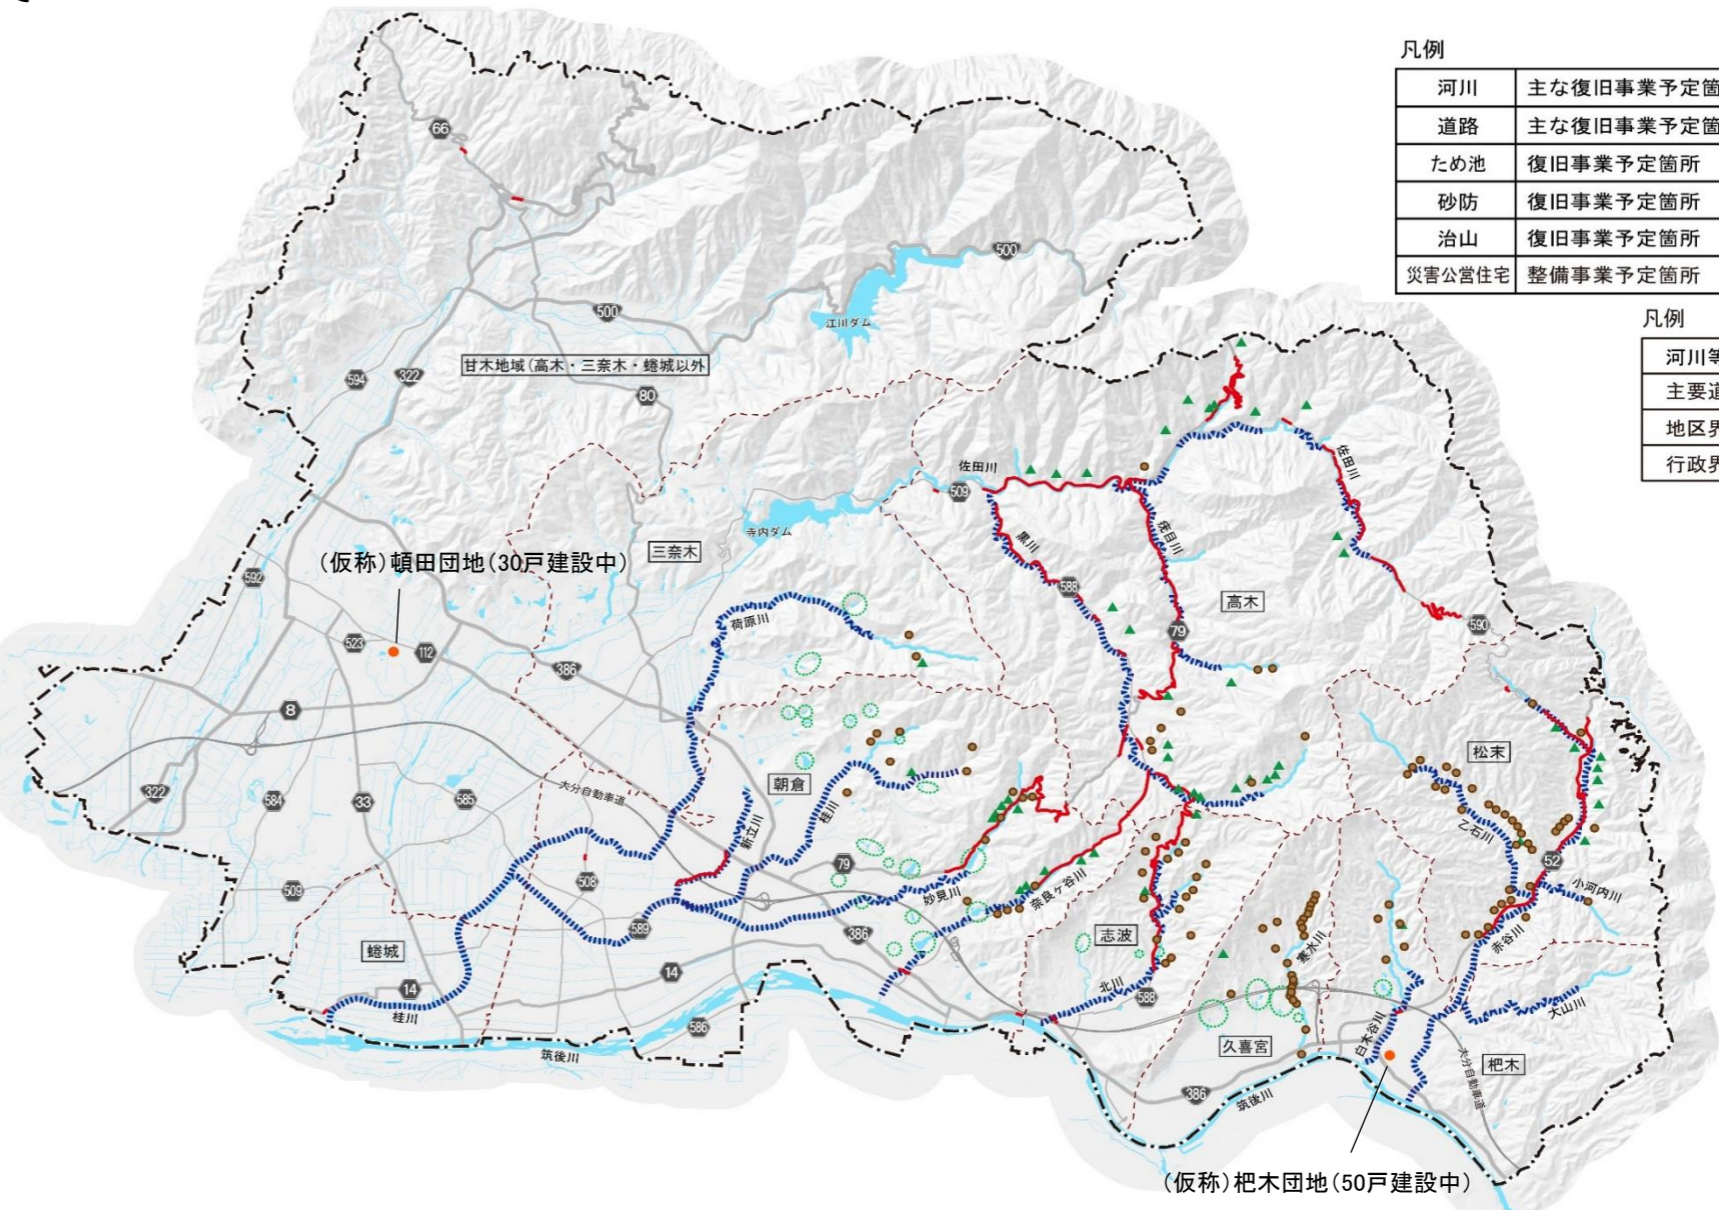

凡例

河川	主な復旧事業予定箇所	■■■■■
道路	主な復旧事業予定箇所	—
ため池	復旧事業予定箇所	○
砂防	復旧事業予定箇所	●
治山	復旧事業予定箇所	▲
災害公営住宅	整備事業予定箇所	●

凡例

河川等	—
主要道路	—
地区界	- - -
行政界	- · - ·

治山

○林野庁九州森林管理局

- ・32箇所直轄治山事業(旧朝倉町、旧杷木町、国有林)を実施。
- 2箇所は工事完了、22箇所は工事中。

○朝倉農林事務所

- ・25箇所直轄治山事業(旧甘木市)を実施。
- 1箇所は工事完了、10箇所は工事中。
- ※次年度計画箇所は調整中。

ため池

○朝倉農林事務所

- ・規模が大きい6箇所(山の神、鎌塚、三反田ほか)を代行で担当。
- ・1箇所は工事完了、3箇所は工事中または契約済み。

○朝倉市農林課

- ・29箇所のうち、8箇所は工事完了、19箇所は工事中。

農地、農業用施設

○朝倉市農地改良復旧室

- ・15事業地区(約155ha)で区画整理型農地復旧を計画(全国初)。
- 連日、地権者等と協議を重ねながら、事業計画を検討中。

○朝倉市農林課

- ・平野部農地(11工区約183ha)の復旧はほぼ完了(進捗率99%)。
- ・山間部農地、農業用施設については、554箇所設計審査協議中。
- 審査終了後、エリアにまとめて随時発注。

林道

○林野庁九州森林管理局

- ・3路線(併用林道)のうち、1路線は工事完了、2路線は工事中。

○朝倉農林事務所

- ・1路線(開設中に被災した高木線)を代行で担当(工事中)。

○朝倉市農林課

- ・34路線のうち、4路線は工事完了、11路線は工事中。
