

河川(朝倉県土整備事務所、災害河川第2課、TEL41-4095・4096)

- ・桂川
大分自動車道から万徳寺周辺まで護岸工事を実施中。
妙見川合流～大分自動車道の一部区間で1月から工事着手予定。
その他の区間も、用地交渉後、順次、発注予定。
- ・荷原川
大分自動車道～国道386号の一部区間で1月から工事着手予定。
その他区間では、用地調査を実施中。用地交渉後、速やかに工事着手。
- ・新立川
桂川合流付近から朝倉コミュニティ付近右岸護岸工事を実施中。
その他の区間も、用地交渉後、順次、発注予定。
- ・妙見川
県道甘木朝倉田主丸線から国道386号付近左岸護岸工事を実施中。
その他の区間も、用地交渉後、順次、発注予定。

河川(朝倉市、公共土木施設災害対策室、TEL62-2707)

- ・奈良ヶ谷川(通堂川)
埋塞土砂撤去完了。計画変更協議中。変更決定後、発注。
- ・八坂川
上流部:埋塞土砂撤去完了。変更協議中。変更決定後、発注。
下流部:工事中(H30年度完了)
- ・その他市管理河川
6河川で工事完了。

道路(朝倉県土整備事務所、災害道路課、TEL41-2597)

- ・国道386号 工事完了
- ・県道金川田主丸線 工事完了
- ・県道福光朝倉線 河川工事と合わせて工事実施中(4箇所中2箇所)
- ・朝倉小石原線 工事実施中(用地買収が完了した箇所から工事着手)

道路(朝倉市、公共土木施設災害対策室、62-2707)

- ・山田・黒川線
堆積土砂撤去完了。被災状況調査中。
- ・その他の市管理道路
36路線のうち、16路線で工事完了。10路線で施工中。

砂防(朝倉県土整備事務所、災害砂防第2課、41-4093)


- ・災害関連緊急事業
砂防 2溪流(奈良ヶ谷川、八坂川 施工中)、
急傾斜地崩壊対策 3地区(長安寺地区、宮野地区で施工中、
八坂地区は3月までに発注)
- ・砂防激甚災害対策特別緊急事業 9溪流
(現在、全体計画を策定し国と協議中)
- ・砂防施設災
妙見川(国との協議設計中)、桂川(工事完了)

治山(林野庁九州森林管理局 TEL096-328-3632)

- ・奈良ヶ谷川(市道(山田・黒川線)沿線)
治山工事実施中 治山ダム 7基
入札公告中 航空実播工 約13ha
- ・妙見川
治山工事実施中 治山ダム 7基
入札公告中 治山ダム 2基
- ・山後地区
治山工事実施中 山腹工 1箇所
※次年度計画箇所調整中

朝倉市復興計画(H30.3)における主な事業予定箇所

※個別事業の進捗状況は参考資料3(6～9頁)を参照。

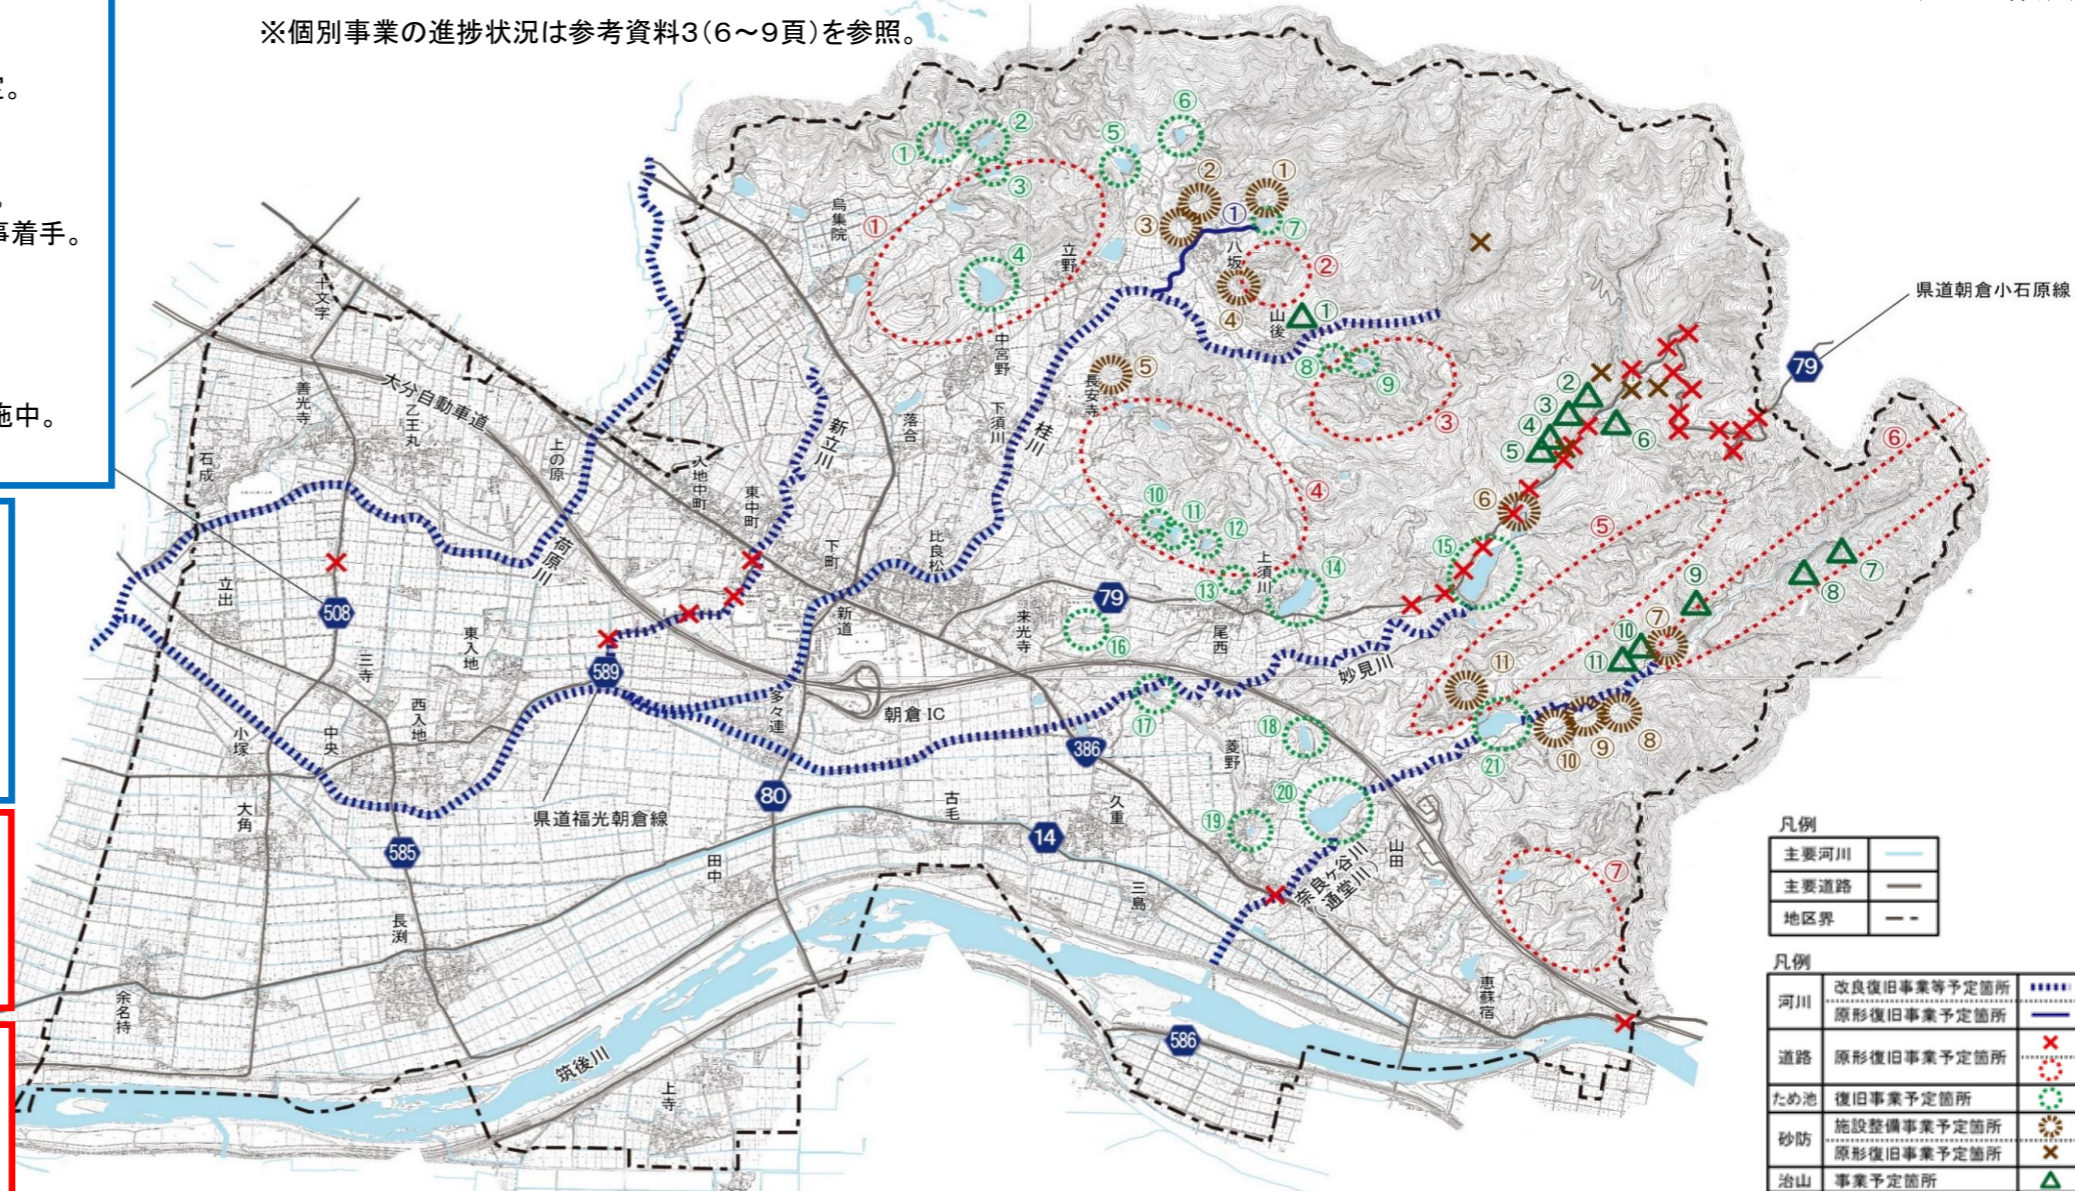

ため池(福岡県朝倉農林事務所、農村整備第1課、TEL41-2563)

- ・山的神ため池_洪水吐工事、取水設備工事を実施中。
堤体工事を二期工事として、平成31年度に着手予定。
- ・鎌塚ため池_洪水吐工事、堆積土撤去工事、法枠工事を実施中。
- ・三反田ため池_堆積土撤去工事(一期)を実施中。
二期工事を平成31年度に着手予定。
- ・辰ヶ迫ため池_ブロック積工事を1月中に入札予定。(年度内完了見込)
- ・上須川ため池_三反田ため池完了後に着手予定。

ため池(朝倉市、農林課、TEL52-1115)

- 完了6箇所(本村、八坂谷、北八坂、上来光寺、千代田、堤)
- 施工中7箇所(ムクジ、長尾下、牟田谷、牟田谷中、山陰、山陰上、本村)
- 発注準備中2箇所(サコタ:年度内発注、原菱野:河川計画があり発注未定)

林道(朝倉市、農林課、TEL52-1115)

- ・山尾坂線
他事業関連(砂防、県道)があり付替林道を調整中。

農地(区画整理型)(朝倉市、農地改良復旧室、TEL28-7907)

- 奈良ヶ谷川流域 3.5ha、妙見川上中流域 1.6ha、妙見川流域第3地区 5.3ha、
桂川山後地区 5.0ha、桂川須川・比良松地区 4.3ha、桂川宮野・入地地区 5.3ha
(事業進捗と当面の主な予定)
- ・農地改良復旧事業(区画整理)の事業着手に向けて役員を主体に換地計画素案等の事業計画を検討中。
- ・当面の主な予定としては、①事業計画概要書の市議会上程、②事業計画概要書の公告等を行う。

農地(区画整理型以外)、農業用施設(朝倉市、農林課、TEL52-1115)

- ・平野部農地(土砂流入撤去9工区168ha)
完了:8工区167ha(進捗率99%)、
未完了:山田地区1ha(1月末完了予定)
- ・山間部農地・農業用施設
簡易査定339箇所の設計審査協議中。審査終了後、エリアにまとめて随時発注予定。
