

地区別復旧事業の進捗状況(松末地区)

河川(国土交通省九州北部豪雨復興出張所、Tel.63-3100)

- これまでに実施した応急復旧の現地状況を確認し、必要に応じて掘削、補修等を実施
- 赤谷川
上流地区の災害復旧工事(原形復旧)実施中。引き続き工事を促進
区画整理事業の状況等も踏まえ、仮橋、工事用道路の施工を行うとともに一部の区間で改良復旧工事に着手
- 乙石川
乙石川からの土砂流出抑制も兼ねた、ブロックによる仮河道整備を実施中
引き続き、区画整理事業の状況等も踏まえ、改良復旧工事に着手
- 大山川
災害復旧工事(原形復旧)を実施中。引き続き、工事を促進

河川(朝倉市、公共土木施設災害対策室、Tel.62-2707)

- 小内川 河道掘削完了
※復旧方法については、国が実施する砂防事業と調整中
- その他市管理の3河川についても、他事業者と調整中
土師川:国(砂防)、崩谷川:国(砂防)、正信川:県(砂防)

道路(朝倉県土整備事務所、災害道路課、Tel.41-2597)

- 県道八女香春線 工事実施中
- 県道安谷赤谷線 工事実施中

道路(朝倉市、公共土木施設災害対策室、Tel.62-2707)

- 市道10路線のうち、1路線で工事完了

砂防(国土交通省九州北部豪雨復興出張所、Tel.63-3100)

- これまで実施した応急対策の現地状況を確認し、必用に応じて補修、補強を実施
- 崩谷川をはじめとした砂防堰堤工事の推進を図るとともに、事業用地取得状況に応じて新たな砂防堰堤工事に着手し、地域の安全度を高める

砂防(朝倉県土整備事務所、災害砂防第1課、Tel.41-2638)

- 災害関連緊急砂防事業
1溪流(正信川で施工中)
- 砂防激甚災害対策特別緊急事業
1溪流(正信川 現在、全体計画を策定し国と協議中)
- 急傾斜地崩壊対策事業
4地区(星丸地区、正信地区、真竹地区、蔵谷地区で施工中)

治山(林野庁九州森林管理局 Tel.096-328-3632)


- 赤谷川(県道52号沿線)
治山工事実施中 治山ダム 10基
山腹工 2箇所
入札公告中 山腹工 2箇所
- 乙石川
治山工事実施中 山腹工 1箇所
※次年度計画箇所調整中

農地(区画整理型)(朝倉市農地改良復旧室、Tel.28-7907)

- 赤谷川流域 45.2ha、乙石川流域 25.6ha
(事業進捗と当面の主な予定)
- 農地改良復旧事業(区画整理)の事業着手に向けて役員を主体に換地計画素案等の事業計画を検討中。
- 当面の主な予定としては、①事業計画概要書の市議会上程、②事業計画概要書の公告等を行う。

朝倉市復興計画(H30.3)における主な事業予定箇所

※個別事業の進捗状況は参考資料3(1~3頁)を参照。

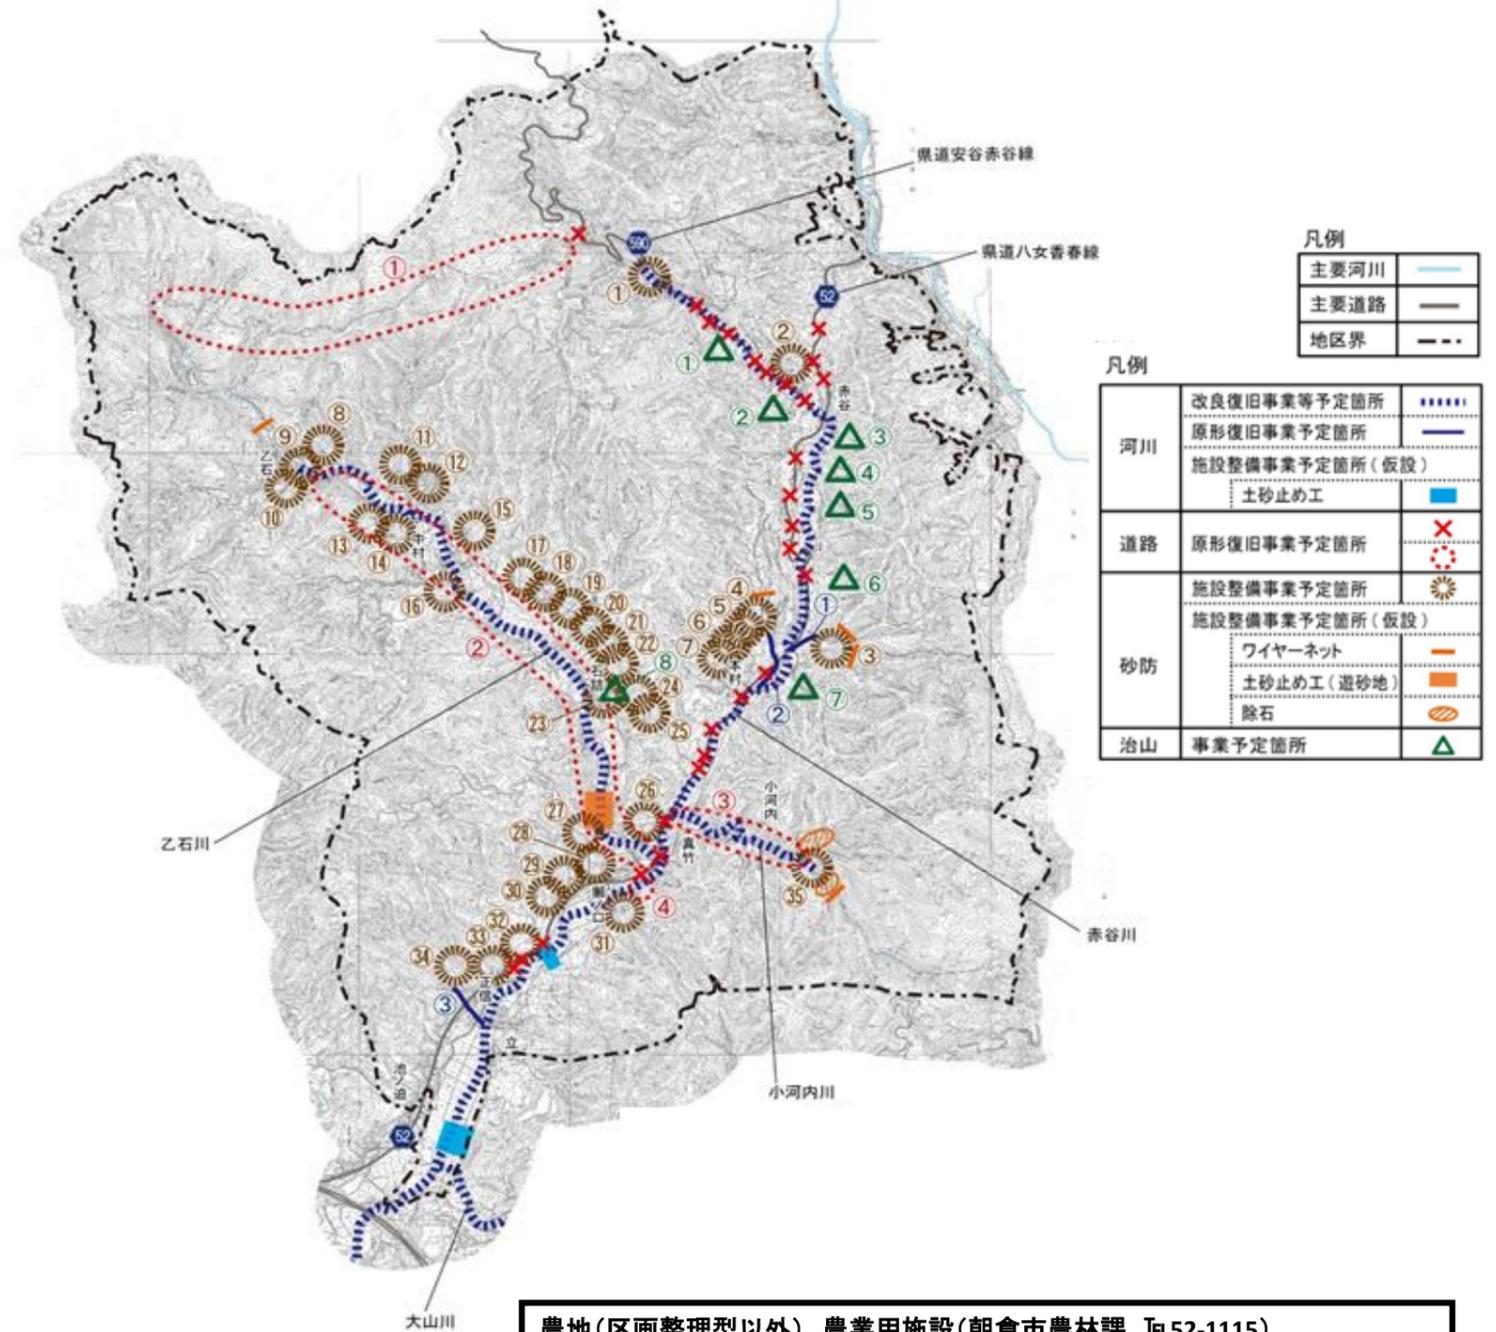

農地(区画整理型以外)、農業用施設(朝倉市農林課、Tel.52-1115)

- 簡易査定22箇所の設計審査協議中、審査終了後、エリアにまとめて随時発注予定
- 赤谷川、乙石川、小内川周辺は河川復旧・区画整理事業の状況を見ながら対応

林道(朝倉市、農林課、Tel.52-1115)

- 中村白木線、他1路線で施工中、1路線契約手続中。
- 乙石線、他2路線は隣接林道の施工後着手予定。
- 柚ノ木谷線、他7路線は他事業関連(砂防、治山)による付替林道で調整中。
