

地区別復旧事業の進捗状況(志波地区)

河川(朝倉県土整備事務所、災害河川第1課、TEL41-2604)

- ・北川
詳細設計及び用地調査を実施中。
設計が完了した区間から順次、説明会を実施し、用地交渉後に
工事着手予定。

河川(朝倉市、公共土木施設災害対策室、TEL62-2707)

- ・平川
変更協議が概ね終了。詳細設計が完了次第、工事発注。
今後、境界確認等を随時実施予定。
- ・その他の市管理河川
7河川のうち、2河川で工事完了。2河川で施工中。

道路(朝倉県土整備事務所、災害道路課、TEL41-2597)

- ・県道甘木吉井線 工事实施中
(用地買収が完了した箇所から工事着手)

道路(朝倉市、公共土木施設災害対策室、TEL62-2707)

- ・市道 17路線のうち、8路線で工事完了。5路線で施工中。

砂防(朝倉県土整備事務所、災害砂防第1課、TEL41-2618)

- ・災害関連緊急事業
砂防 3溪流(内2溪流は工事発注済。他1溪流は用地買収後発注)
急傾斜地対策 1地区(工事契約済)
地すべり対策 3地区(内2地区は施工中。他1地区は工事発注済)
- ・砂防激甚災害対策緊急事業 8溪流(全体計画を策定し、国と協議中)
- ・砂防施設災害 北川(用地交渉中)

治山(林野庁九州森林管理局 TEL096-328-3632)


- ・北川(県道588号沿線)
治山工事实施中 治山ダム 1基
山腹工 2箇所
※次年度計画箇所調整中

ため池(朝倉市、農林課、TEL52-1115)

- ・被災箇所4箇所(施工中)
 - ①茶屋の谷2ため池→浚渫準備中
 - ②茶屋の谷1ため池→出水期までに洪水吐復旧予定
 - ③生津ため池→出水期までに浚渫完了予定
 - ④梅ヶ谷ため池→浚渫完了→今後、底樋ゲート復旧、下流護岸復旧

朝倉市復興計画(H30.3)における主な事業予定箇所

※個別事業の進捗状況は参考資料3(5~6頁)を参照。

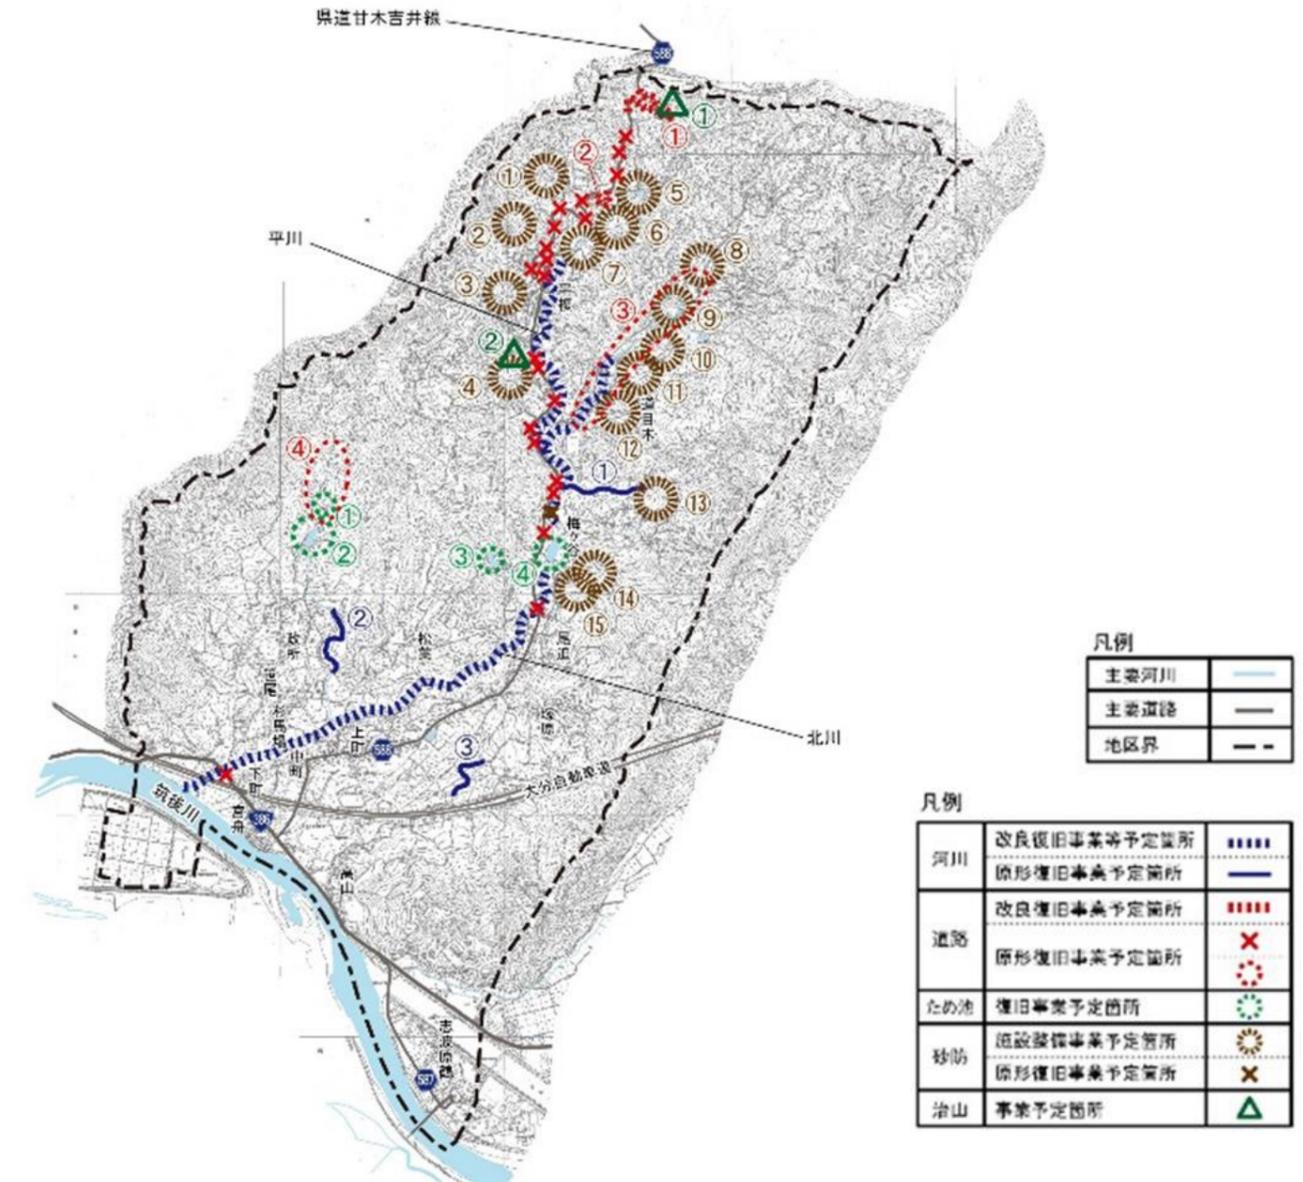

農地(区画整理型)(朝倉市農地改良復旧室、TEL28-7907)

- ・北川・平川平復地区6.0ha、北川道目木・梅ヶ谷地区11.1ha、北川下流域12.3ha
(事業進捗と当面の主な予定)
- ・農地改良復旧事業(区画整理)の事業着手に向けて役員を主体的に
換地計画素案等の事業計画を検討中。
- ・当面の主な予定としては、①事業計画概要書の市議会上程、②事業計
画概要書の公告等を行う。

農地(区画整理型以外)、農業用施設(朝倉市、農林課、TEL52-1115)

- ・簡易査定62箇所の設計審査協議中、審査終了後、エリアにまとめて随時発注予定
- ・上井手水路の通水復旧は発注済、速やかに着工
- ・新井手井堰について北川改良復旧工事と合わせて復旧予定

林道(朝倉市、農林課、TEL52-1115)

- ・奥の丸線
起点側(道目木)より施工中。
- ・米の山線
起点側(久喜宮)終点側(真竹)より施工中。
全6工区中2工区施工中。
終わり次第の工区へ着手予定。
- ・堂廻線
米の山線、奥の丸線隣接林道。
米の山線、奥の丸線完了後、発注予定。
- ・花立線
他事業関連(砂防)にて付替林道を調整中。
